

PROJET DE MEMORIAL RUBEN UM NYOBE A ESEKA

Complexe mémoriel culturel touristique et urbain

Dossier de cadrage stratégique architectural économique et opérationnel

Paramètre	Cadrage proposé
Territoire	Eséka et le département du Nyong-et-Kéllé
Échelle du projet	Avenue urbaine requalifiée et complexe culturel au terme de l'axe
Horizon indicatif	2027 à 2032 en quatre phases conditionnelles
Investissement central	14,45 milliards FCFA en valeur indicative 2026
Finalité	Faire de la mémoire un levier durable de développement urbain et local

PAR MAN MBAÏ LIKOL

Objet du dossier

Le projet propose de faire du Mémorial Ruben Um Nyobè le point d'aboutissement d'une transformation urbaine, culturelle et économique d'Eséka. Le monument, le Musée de l'Indépendance et de la Mémoire Camerounaise, le village culturel Bassa, l'amphithéâtre et l'offre de restauration et d'artisanat forment une destination cohérente. L'avenue principale conserve sa morphologie urbaine réelle et devient le lien entre la vie quotidienne de la ville et le cœur mémoriel.

La décision structurante consiste à réaliser le projet par étapes, avec une première ouverture visible et exploitable. La phase initiale doit améliorer l'avenue, sécuriser le foncier du complexe, construire le monument et organiser l'accueil. Le musée complet et les autres équipements sont engagés lorsque leur financement, leur contenu scientifique et leur modèle d'exploitation sont validés.

Sommaire

Partie	Contenu
1	Vision et contribution au développement d'Eséka
2	Composition urbaine et programme des équipements
3	Expérience mémorielle culturelle et touristique
4	Impacts économiques sociaux et urbains
5	Modèle d'exploitation budget et financement
6	Mise en œuvre gouvernance risques et indicateurs

Chiffres de référence

Indicateur	Hypothèse centrale	Portée
Fréquentation stabilisée	100 000 visites par an	Scénario de planification
Emplois directs	70 à 90	Exploitation du complexe
Activités indirectes et induites	150 à 250	Tourisme, commerce et fournisseurs
Dépenses locales des visiteurs	2,2 milliards FCFA par an	Hors billetterie, hypothèse de 22 000 FCFA par visiteur
Recettes du complexe	910 millions FCFA par an	Billetterie, services, concessions et partenariats
Investissement	14,45 milliards FCFA	Scénario central hors acquisition foncière exceptionnelle

1 Vision et contribution au développement d'Eséka

1 1 Une destination construite autour de la ville

Le projet ne doit pas être conçu comme une enceinte isolée. L'avenue principale demeure un espace de circulation, de commerce et de rencontre. Sa requalification améliore l'accès au complexe sans effacer les activités existantes. Le monument et le musée occupent le terme de la perspective, tandis que les équipements culturels et marchands utilisent les emprises disponibles autour du site supérieur.

Cette organisation permet de répartir les retombées. Les visiteurs traversent la ville, utilisent ses transports, consomment dans ses commerces et identifient Eséka comme destination. Les investissements dans le drainage, les trottoirs, l'éclairage et la signalétique bénéficient aussi aux habitants qui n'entrent pas dans le complexe.

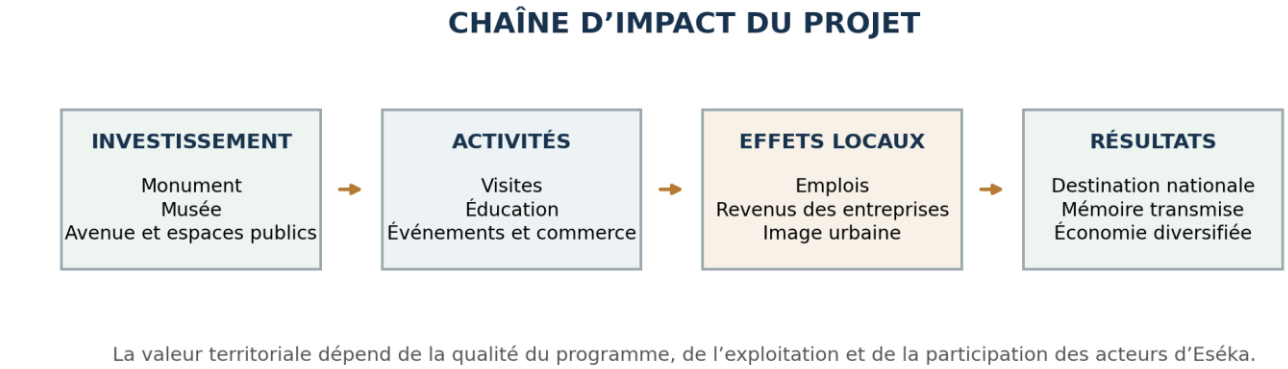


Diagramme 1 Chaîne d'impact proposée pour le projet

1 2 Objectifs mesurables

Objectif	Résultat attendu à cinq ans	Indicateur principal
Mémoire	Un récit national documenté et accessible	Visiteurs, scolaires, fonds numérisés
Économie locale	Des revenus nouveaux pour les entreprises d'Eséka	Achats locaux, nuitées, ventes et concessions
Emploi	Des métiers durables liés à la culture et au tourisme	Emplois locaux et heures de formation
Ville	Une avenue plus sûre, propre et attractive	Éclairage, drainage, cheminements et occupation commerciale
Rayonnement	Une destination identifiée au Cameroun et dans la diaspora	Part des visiteurs venant hors du département

2 Composition urbaine et programme des équipements

2 1 Plan de masse adapté à la géographie de l'avenue

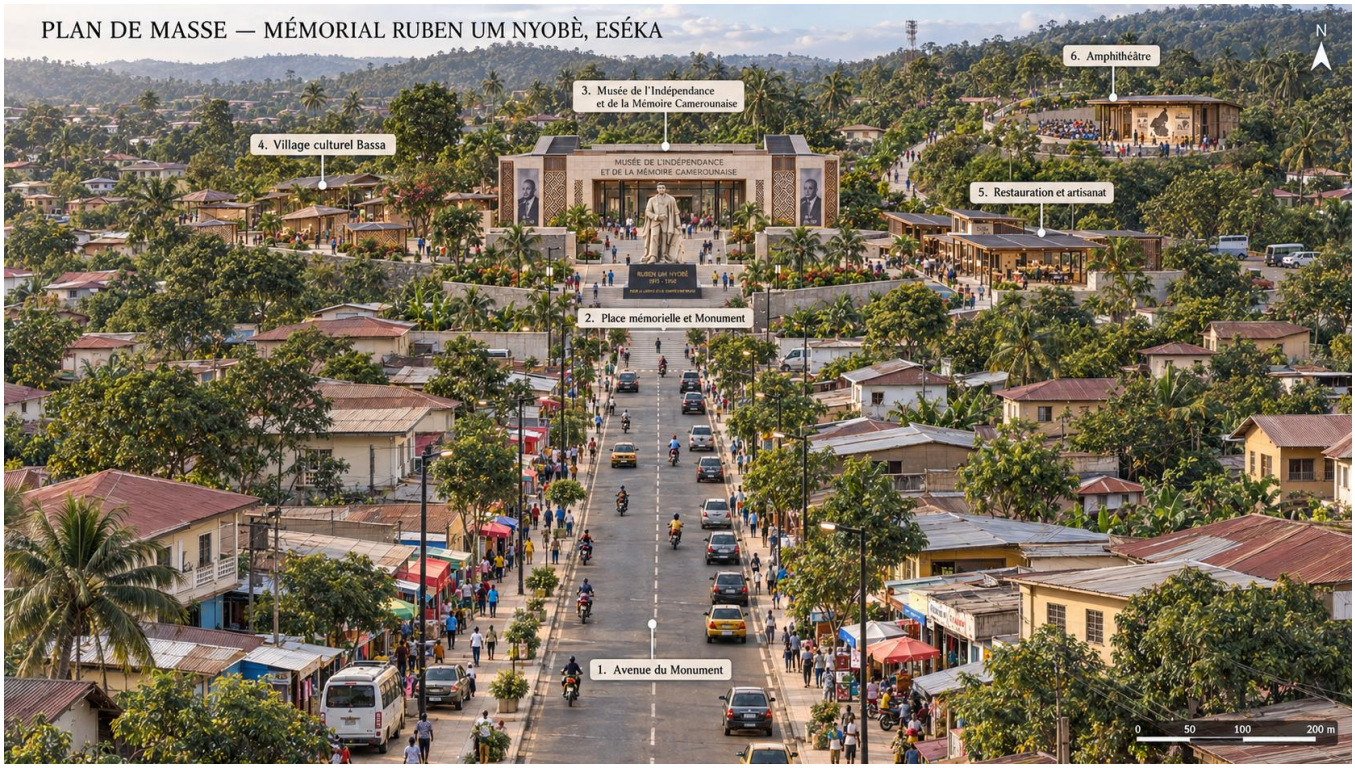


Figure 1 Plan de masse de référence avec l'avenue comme axe d'accès et le complexe concentré au terme de la perspective

Le plan de masse respecte la structure linéaire de l'avenue. La chaussée reste à double sens, sans terre-plein central surdimensionné. Les constructions riveraines et la végétation encadrent l'approche. Le monument et le musée forment le repère terminal. Le village culturel et les activités commerciales occupent des parcelles latérales proches du musée, tandis que l'amphithéâtre s'insère dans la pente et dispose d'un accès technique distinct.

Zone	Fonction	Principe d'implantation
Avenue du Monument	Accès, commerce, transport et promenade	Requalification légère et progressive du corridor existant
Place mémorielle	Cérémonies, contemplation et rassemblement	Parvis compact au terme de l'avenue
Musée	Expositions, archives, médiation et recherche	Bâtiment bas derrière la statue
Village culturel Bassa	Ateliers, transmission, musique et oralité	Pavillons paysagers sur les emprises latérales
Restauration et artisanat	Cuisine, café, vente et démonstration	Cour active reliée au musée mais exploitable séparément
Amphithéâtre	Spectacles, débats et grands événements	Insertion dans la pente avec accès de service périphérique

2 2 L’avenue comme première expérience du projet



Figure 2 Avenue du Monument projetée dans la continuité du tissu urbain d’Eséka

La requalification privilégie les besoins quotidiens. Elle combine réfection de la chaussée, drainage, trottoirs continus, traversées piétonnes, éclairage, plantations, organisation des motos-taxis et espaces de livraison. Les façades peuvent bénéficier d’un programme incitatif d’entretien et d’harmonisation, sans reconstruction générale ni éviction des commerces.

Intervention	Bénéfice pour les habitants	Bénéfice touristique
Drainage et chaussée	Réduction des stagnations et meilleure circulation	Accès fiable en toute saison
Trottoirs et traversées	Sécurité des piétons et des scolaires	Parcours confortable vers le mémorial
Éclairage public	Activité prolongée et sécurité	Visites et restauration en soirée
Organisation commerciale	Meilleure visibilité des commerces	Offre locale lisible et attractive
Signalétique mémorielle	Appropriation de l’histoire locale	Mise en récit avant l’arrivée au musée

2 3 Le monument et la place mémorielle



Figure 3 Monument Ruben Um Nyobè et parvis du Musée de l'Indépendance et de la Mémoire Camerounaise

La statue constitue le repère majeur du projet. Son socle organise la lecture du nom, des dates et de la portée historique de Ruben Um Nyobè. Le parvis accueille les visiteurs ordinaires, les groupes scolaires et les cérémonies nationales. Les bassins, les jardins et les emmarchements doivent rester sobres afin de préserver la visibilité du monument et l'accès au musée.

La conception définitive du visage, des attributs et des inscriptions doit être approuvée par un conseil scientifique à partir d'un corpus documentaire. Les matériaux et la structure seront choisis après étude du climat, de la maintenance, de la sécurité et du coût de cycle de vie.

2 4 Le musée comme équipement national



Figure 4 Proposition pour le grand hall du Musée de l'Indépendance et de la Mémoire Camerounaise

Le musée relie l'histoire de Ruben Um Nyobè à celle du Cameroun. Son parcours distingue les faits documentés, les témoignages et les interprétations. Il comprend des galeries permanentes et temporaires, un centre documentaire, des espaces pédagogiques, un auditorium et des réserves adaptées à l'humidité tropicale.

Séquence	Contenu principal	Dispositifs
Territoires et sociétés	Cultures, langues et organisations avant la colonisation	Cartes, objets et récits
Administrations coloniales	Conquête, travail, fiscalité et transformations	Archives et chronologie
Nationalisme camerounais	Syndicalisme, UPC, indépendance et réunification	Documents, presse et témoignages
Ruben Um Nyobè	Action politique, pétitions et parole internationale	Fac-similés et audiovisuel
Répression et mémoires	Clandestinité, violences, silences et transmissions	Témoignages contextualisés
Héritages contemporains	Citoyenneté, souveraineté et débats publics	Espace participatif et ressources éducatives

2 5 Le village culturel Bassa



Figure 5 Village culturel Bassa conçu comme espace de production de transmission et de rencontre

Le village culturel ne doit pas réduire la culture Bassa à un décor. Les pavillons accueillent des artisans en activité, des ateliers de sculpture, de textile et de vannerie, des démonstrations culinaires, une librairie, des espaces de récit oral et une petite scène. La programmation est confiée à des praticiens, associations et chercheurs liés au territoire.

Fonction	Capacité indicative	Mode d'exploitation
Ateliers de production	12 à 16 unités	Convention avec artisans et coopératives
Transmission	4 espaces modulables	Stages, écoles et démonstrations
Scène et oralité	150 à 250 personnes	Programmation culturelle régulière
Librairie et ressources	100 m^2 environ	Éditions, archives accessibles et jeunesse
Marché thématique	Occupation variable	Sélection fondée sur qualité et origine

2 6 La restauration et l’artisanat



Figure 6 Cour de restauration et d’artisanat reliée au parcours mémoriel

Le pôle marchand regroupe un restaurant culturel, une cuisine ouverte, un café, une terrasse et une galerie-boutique. Son architecture reste cohérente avec le musée et le village culturel. Les concessions réservent une part aux entreprises locales et imposent des critères d’hygiène, de qualité, de traçabilité et de présentation.

Offre	Clientèle principale	Contribution économique
Restaurant culturel	Familles, groupes et événements	Emplois, achats agricoles et recettes de concession
Café du patrimoine	Visiteurs et habitants	Animation quotidienne et soirée
Galerie-boutique	Touristes, diaspora et institutions	Débouchés pour produits labellisés
Cuisine ouverte	Écoles et visiteurs	Transmission et valorisation des produits locaux
Cour événementielle	Marchés et rencontres	Location, programmation et fréquentation répétée

2 7 L’amphithéâtre et la programmation



Figure 7 Amphithéâtre paysager destiné aux spectacles débats cérémonies et festivals

L’amphithéâtre offre environ 1 000 à 1 200 places. Son implantation dans la pente limite les terrassements et éloigne les flux techniques de la place mémorielle. Il accueille spectacles, projections, débats, cérémonies, festivals et événements scolaires. Son calendrier doit compléter le musée et soutenir l’hôtellerie, la restauration et les transports locaux.

Période	Programme possible	Effet territorial recherché
Février à juin	Visites scolaires et concours d’histoire	Fréquentation régulière hors vacances
Juillet et août	Spectacles, ateliers familles et marché culturel	Séjours familiaux et dépenses locales
Septembre	Journées Ruben Um Nyobè et forum de la mémoire	Rayonnement national et médiatique
Octobre à novembre	Rencontres universitaires et résidences	Recherche, publication et création
Décembre	Musique, gastronomie et artisanat	Animation de fin d’année

3 Expérience mémorielle culturelle et touristique

3 1 Parcours type

Étape	Expérience	Durée indicative	Dépense associée
Arrivée en ville	Avenue, signalétique et commerces	20 min	Transport et achats courants
Place mémorielle	Monument, médiation et cérémonie	25 min	Guide ou audioguide
Musée	Parcours permanent et exposition	75 min	Billet et édition
Village culturel	Atelier, musique et transmission	60 min	Atelier et artisanat

Étape	Expérience	Durée indicative	Dépense associée
Restauration	Cuisine Bassa et camerounaise	60 min	Repas et café
Prolongement	Spectacle ou circuit territorial	2 h à 1 jour	Transport, nuitée et services

La durée de visite doit encourager le séjour plutôt que le simple passage. Les offres combinées associent musée, atelier, repas, spectacle et, lorsque les conditions d'accès et de conservation le permettent, des circuits vers d'autres lieux de mémoire du Nyong-et-Kéllé.

3 2 Accessibilité éducation et médiation

- Des tarifs scolaires réduits et des créneaux réservés facilitent les visites des établissements publics et privés.
- Les contenus sont proposés en français, en anglais et en bassa, avec des versions adaptées aux enfants et aux personnes en situation de handicap.
- Le centre documentaire numérise les archives autorisées et prépare des ressources pour les enseignants, étudiants et chercheurs.
- Les guides locaux suivent une formation en histoire, accueil, premiers secours, langues et conduite de groupe.
- Les dispositifs numériques complètent les objets, les archives et la parole humaine sans les remplacer.

3 3 Produits touristiques à commercialiser

Produit	Contenu	Public prioritaire
Découverte	Monument, musée et visite guidée courte	Visiteurs de passage et familles
Journée mémoire et culture	Musée, atelier, repas et village culturel	Écoles, associations et entreprises
Week-end à Eséka	Visite, spectacle, hébergement et circuit territorial	Familles, diaspora et touristes
Programme universitaire	Archives, conférence, terrain et résidence	Étudiants, chercheurs et créateurs
Événement institutionnel	Amphithéâtre, restauration et médiation privée	Institutions et organisations


La commercialisation doit combiner réservation en ligne, accords avec les établissements scolaires, partenariats avec les transporteurs et vente directe par les entreprises d'Eséka. Les forfaits précisent la part revenant au complexe, aux guides, aux restaurateurs, aux artisans et aux hébergeurs.

3 4 Gestion des flux et qualité de visite

Les groupes scolaires, les visiteurs individuels, les événements et les livraisons utilisent des créneaux et des accès différenciés. Une jauge quotidienne protège les collections, réduit les files et maintient la qualité de l'expérience. Les données de réservation servent à planifier le personnel, le transport et les commandes des opérateurs locaux.

4 Impacts économiques sociaux et urbains

4 1 Hypothèses de fréquentation et de recettes

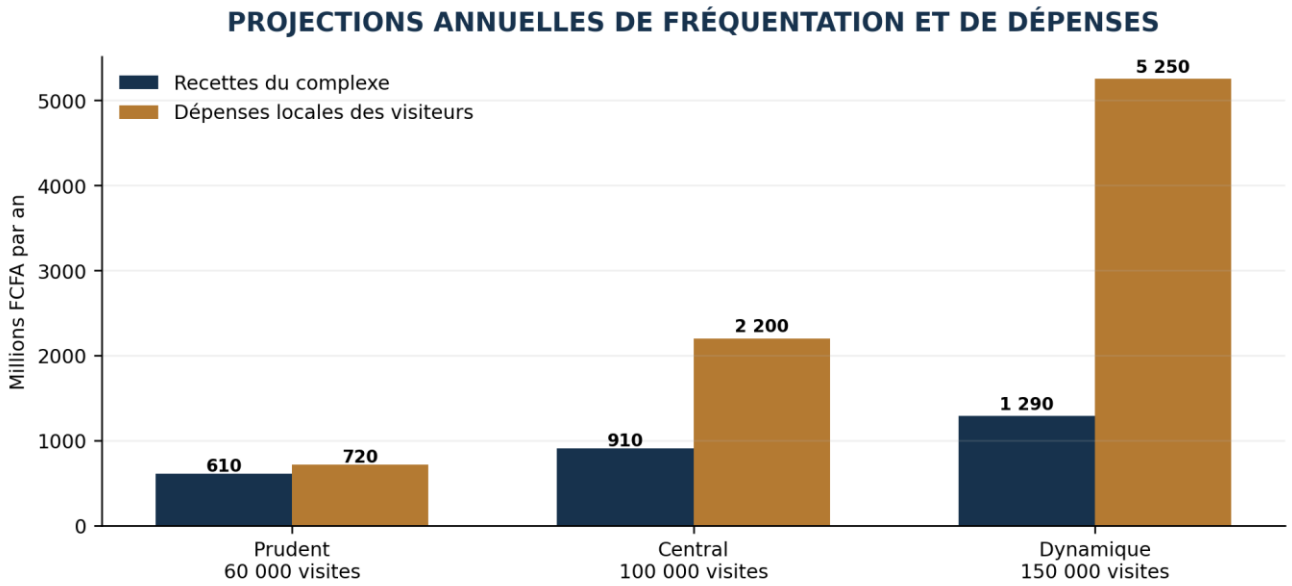


Dépenses locales hors billetterie : 12 000, 22 000 et 35 000 FCFA par visiteur selon le scénario.

Graphique 1 Projections annuelles selon trois scénarios de fréquentation

Scénario	Visites par an	Recettes du complexe	Dépense locale moyenne	Dépenses locales
Prudent	60 000	610 M FCFA	12 000 FCFA	720 M FCFA
Central	100 000	910 M FCFA	22 000 FCFA	2,20 Md FCFA
Dynamique	150 000	1,29 Md FCFA	35 000 FCFA	5,25 Md FCFA

Ces montants sont des simulations de planification, et non des recettes garanties. La dépense locale comprend l'hébergement, la restauration, le transport, l'artisanat et les autres services achetés à Eséka. Elle exclut la billetterie déjà comptabilisée dans les recettes du complexe. L'étude de marché devra tester les comportements de visite, la saisonnalité et la capacité d'accueil avant l'engagement des phases lourdes.

4 2 Circulation des dépenses dans l'économie locale

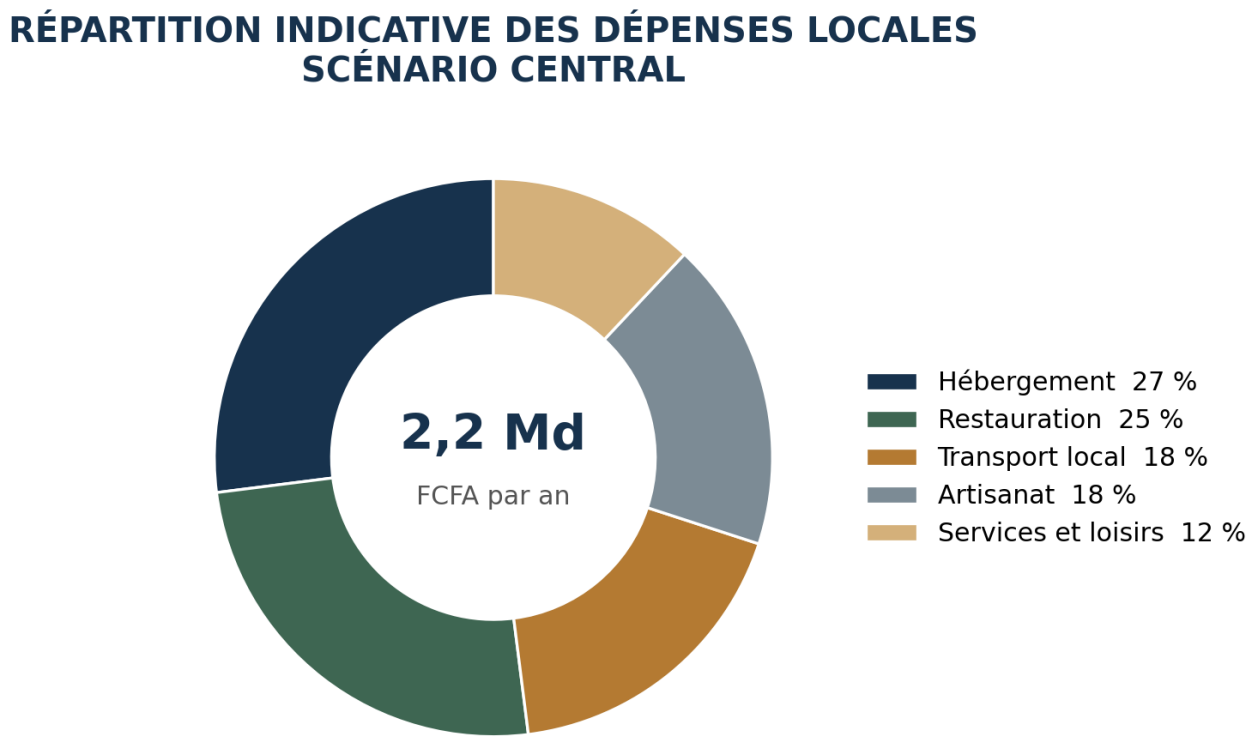


Graphique 2 Répartition indicative de 2,2 milliards FCFA de dépenses locales dans le scénario central

Dans le scénario central, les visiteurs injecteraient environ 2,2 milliards FCFA par an dans l'économie locale, hors billetterie. La part réellement captée par Eséka dépendra de l'existence de chambres, de restaurants fiables, d'offres artisanales identifiables, de transports organisés et de fournisseurs capables de répondre aux marchés du complexe.

Levier	Action avant ouverture	Indicateur de captation locale
Hébergement	Accompagnement à la mise à niveau des chambres et réservations	Nuitées vendues et taux d'occupation
Restauration	Hygiène, menus, achats agricoles et service de groupes	Part des achats effectués dans le département
Artisanat	Design, qualité, prix, conditionnement et label	Ventes et nombre de producteurs référencés
Transport	Charte des motos-taxis, taxis et navettes	Courses, sécurité et satisfaction
Fournitures	Allotissement accessible aux PME locales	Valeur annuelle des achats locaux

4 3 Emplois compétences et entrepreneuriat

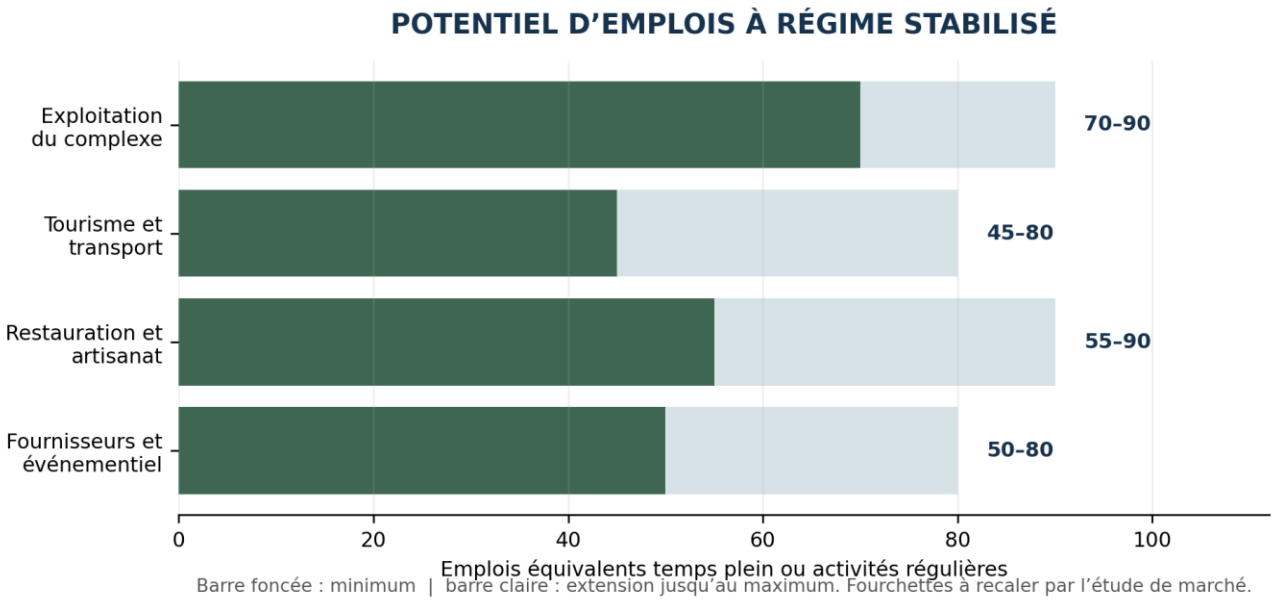

Graphique 3 Fourchettes d'emplois et d'activités régulières à régime stabilisé

Le complexe pourrait mobiliser 70 à 90 emplois directs et soutenir 150 à 250 emplois indirects ou induits. Les principaux métiers concernent la médiation, la conservation, l'accueil, la maintenance, la sécurité, les jardins, la programmation, le transport, la restauration, l'artisanat et l'événementiel. Les recrutements locaux exigent un programme de formation lancé au moins dix-huit mois avant l'ouverture.

Programme	Bénéficiaires	Cible indicative
Académie des guides	Jeunes diplômés et associations	25 à 40 personnes
Incubation tourisme et culture	TPE de restauration, transport et services	20 à 30 entreprises
Qualité artisanale	Artisans et coopératives	40 à 60 producteurs
Maintenance et paysage	Techniciens et entreprises locales	20 à 35 personnes
Stages et apprentissage	Élèves, étudiants et centres de formation	50 placements par an

4 4 Impacts sociaux mémoriels et éducatifs

Dimension	Effet attendu	Mesure annuelle
Mémoire nationale	Accès à un récit documenté de l'indépendance	Visiteurs, consultations et fonds numérisés
Jeunesse	Meilleure connaissance de l'histoire camerounaise	Élèves accueillis et supports pédagogiques utilisés
Culture Bassa	Transmission par des praticiens et non par le décor	Ateliers, artistes et langues mobilisées
Cohésion	Dialogue entre générations, territoires et interprétations	Rencontres, débats et diversité des publics
Fierté urbaine	Amélioration de l'image et de l'usage des espaces publics	Enquêtes habitants et entretien de l'avenue

L'impact mémoriel ne se réduit pas au nombre d'entrées. La qualité des sources, la pluralité des intervenants, l'accueil des écoles, la production éditoriale et la capacité à ouvrir un débat rigoureux constituent les principaux critères de réussite. Le conseil scientifique publie ses méthodes, ses références et ses règles de traitement des témoignages.

4 5 Transformation attendue de la ville

Situation à traiter	Intervention du projet	Transformation recherchée
Avenue peu confortable	Drainage, trottoirs, éclairage et traversées	Mobilité quotidienne plus sûre
Séjours courts	Offres combinées et calendrier culturel	Augmentation de la durée de présence
Commerce dispersé	Signalétique, qualité et réservation	Meilleure visibilité des entreprises locales
Patrimoine peu structuré	Musée, monument et circuits territoriaux	Identité touristique claire
Peu de métiers culturels	Formation, programmation et archives	Nouvelles compétences durables
Faible activité en soirée	Éclairage, café, spectacles et sécurité	Extension maîtrisée des horaires économiques

Le projet peut devenir un catalyseur, mais il ne remplacera pas les politiques urbaines ordinaires. La commune et les services publics doivent maintenir la voirie, la propreté, l'éclairage, la sécurité et le contrôle des occupations. Le complexe doit financer sa propre maintenance et contribuer, par convention, à l'entretien des espaces directement liés à son activité.

5 Modèle d'exploitation budget et financement

5 1 Recettes annuelles dans le scénario central

Source	Hypothèse	Montant annuel
Billetterie	100 000 visites et panier moyen pondéré	250 M FCFA
Guidage et programmes scolaires	Circuits, ateliers et médiation	90 M FCFA
Événements et locations	25 à 35 événements	75 M FCFA
Concessions	Restaurant, café, marché et services	140 M FCFA
Boutique et éditions	Marge nette d'exploitation	55 M FCFA
Parking et services	Visiteurs et événements	30 M FCFA
Mécénat et partenariats	Contrats annuels	120 M FCFA
Dotation de mission publique	Éducation, conservation et archives	150 M FCFA
Total	Scénario central	910 M FCFA

5 2 Charges et équilibre d'exploitation

Charge	Montant central
Personnel permanent et saisonnier	300 M FCFA
Maintenance bâtiments jardins et monument	150 M FCFA
Sécurité énergie eau et assurances	140 M FCFA
Programmation expositions et médiation	110 M FCFA
Marketing vente et partenariats	65 M FCFA
Numérique archives et conservation	45 M FCFA

Charge	Montant central
Administration audit et imprévus	40 M FCFA
Total	850 M FCFA

Le scénario central dégage un solde annuel indicatif de 60 millions FCFA. Le projet ne peut toutefois pas rembourser l'investissement patrimonial par la seule billetterie. L'objectif financier est de couvrir progressivement l'exploitation, tandis que l'investissement public se justifie par les effets urbains, éducatifs, mémoriels et économiques. Une réserve de maintenance doit être alimentée avant toute distribution ou extension.

5 3 Budget d'investissement indicatif

Poste	Montant
Études concours maîtrise d'œuvre et contrôle	650 M FCFA
Voiries réseaux terrassements et drainage	1 800 M FCFA
Statue socle bassin et place mémorielle	1 200 M FCFA
Musée et centre documentaire	3 800 M FCFA
Scénographie collections et équipements	1 400 M FCFA
Village culturel Bassa	750 M FCFA
Amphithéâtre et équipements de scène	550 M FCFA
Restaurant café boutique et accueil	450 M FCFA
Paysage jardins et éclairage	650 M FCFA
Énergie eau numérique et sûreté	750 M FCFA
Parking ateliers et équipements de service	350 M FCFA
Communication de lancement et formation	250 M FCFA
Provision pour aléas et inflation	1 850 M FCFA
Total central	14 450 M FCFA

Les montants sont des ordres de grandeur en francs CFA constants 2026. Ils seront recalés après étude foncière, topographie, géotechnique, programme muséographique, avant-projet architectural et stratégie d'acquisition des collections. Toute augmentation du programme doit être accompagnée de son financement et de ses charges annuelles.

5 4 Financement recommandé

Source	Part cible	Affectation privilégiée
État et collectivités	45 %	Avenue, monument, musée et espaces publics
Partenaires de développement	20 %	Musée, archives, formation et accessibilité
Entreprises et diaspora	15 %	Collections, programmation, bourses et équipements
Partenariats privés ciblés	15 %	Restaurant, boutique, énergie et hébergement éventuel
Dons patrimoniaux	5 %	Acquisitions, restauration et publications

Les fonctions patrimoniales restent sous contrôle public ou d'intérêt public. Les partenariats privés sont limités aux activités commerciales clairement séparées du récit scientifique, de la conservation et de l'accès aux archives.

6 Mise en œuvre gouvernance risques et indicateurs

6 1 Calendrier et portes de décision

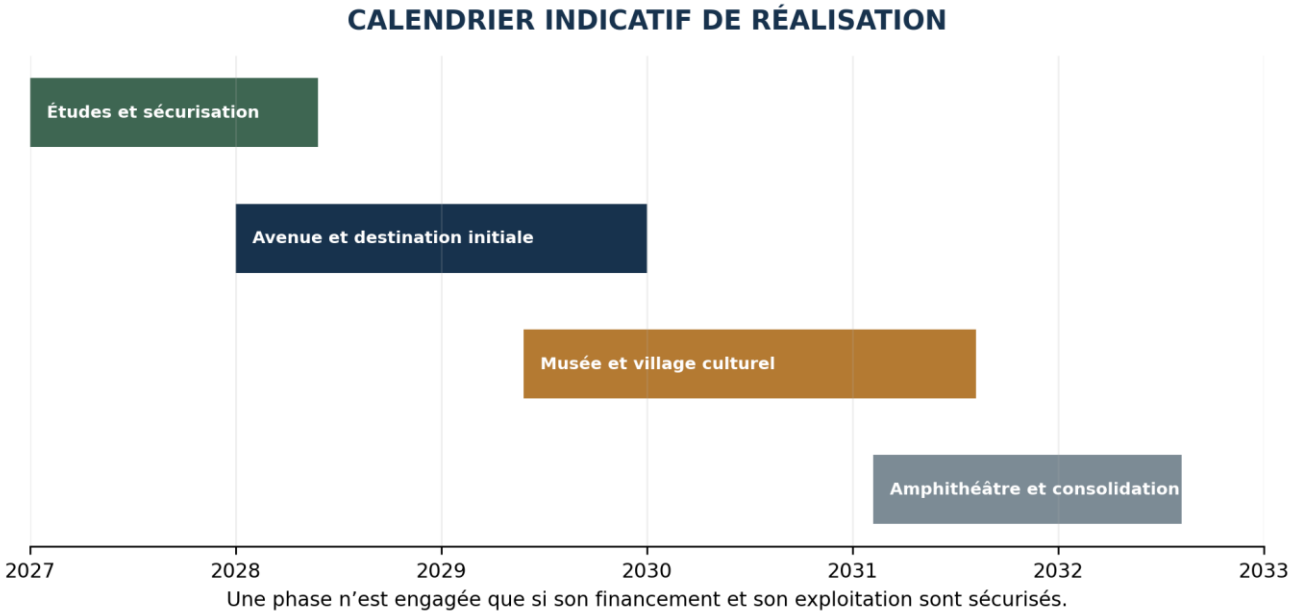


Diagramme 2 Calendrier indicatif et chevauchement des phases

Porte de décision	Condition minimale
Foncier	Titre et emprises sécurisés, topographie et accès validés
Contenu	Conseil scientifique installé, inventaire des sources engagé
Conception	Programme, concours et coût de cycle de vie approuvés
Travaux	Financement de la phase couvert et marchés contrôlés
Ouverture	Équipe recrutée, essais avec écoles et plan de maintenance financé
Extension	Fréquentation, qualité de service et équilibre réévalués

6 2 Gouvernance proposée

Organe	Responsabilité	Garantie attendue
Comité de pilotage	Arbitrages, foncier, financement et coordination	Décisions publiées et calendrier suivi
Maîtrise d'ouvrage	Études, marchés, travaux, coûts et délais	Équipe dédiée et rapports trimestriels
Conseil scientifique	Sources, récits, acquisitions et éthique	Pluralité, indépendance et références accessibles
Conseil territorial	Commune, communautés, jeunes, femmes et entreprises	Participation locale et prévention des conflits
Direction d'exploitation	Accueil, programmation, commercial et maintenance	Contrat de performance annuel

Organe	Responsabilité	Garantie attendue
Comité d'audit	Finances, achats, risques et conflits d'intérêts	Contrôle indépendant et recommandations suivies

6 3 Principaux risques

Risque	Niveau	Mesure de maîtrise
Foncier ou accès inadapté	Élevé	Audit foncier, consultation, topographie et étude de trafic
Politisation du récit	Élevé	Conseil scientifique pluraliste et publication des sources
Dépassement des coûts	Élevé	Phasage, revue indépendante, contingence et contrôle des modifications
Faible fréquentation	Moyen à élevé	Accords scolaires, programmation, transport et commercialisation
Maintenance insuffisante	Élevé	Fonds dédié, matériaux adaptés et contrats de performance
Faible captation locale	Moyen	Formation, allotissement, concessions locales et suivi des achats
Sécurité des visiteurs	Moyen	Plan de sûreté, secours, éclairage et gestion de foule

6 4 Tableau de bord de développement territorial

Indicateur	Situation de départ	Cible après cinq ans	Fréquence
Visiteurs annuels	À établir	100 000 scénario central	Mensuelle
Part de visiteurs hors département	À établir	Au moins 60 %	Trimestrielle
Emplois directs occupés localement	À établir	Au moins 60 %	Semestrielle
Achats auprès d'entreprises locales	À établir	Au moins 35 % des achats éligibles	Trimestrielle
Élèves accueillis	À établir	25 000 par an	Trimestrielle
Dépense locale moyenne	Enquête initiale	22 000 FCFA scénario central	Annuelle
Taux de satisfaction visiteurs	À établir	Au moins 85 %	Mensuelle
Disponibilité des équipements	À établir	Au moins 95 %	Mensuelle
Fonds de maintenance exécuté	Sans objet	100 % du budget approuvé	Annuelle

Conclusion et décisions prioritaires

Le Mémorial Ruben Um Nyobè peut devenir un projet structurant pour Eséka si le développement urbain, le contenu historique et l'économie locale sont traités ensemble. Le monument donne une visibilité nationale au site. Le musée assure la profondeur scientifique. Le village culturel, l'amphithéâtre, la restauration et l'artisanat créent des raisons de prolonger la visite et de revenir. L'avenue relie ces équipements à la ville réelle et diffuse une partie des bénéfices vers les habitants et les commerces.

Décisions à prendre dans les douze premiers mois

- Sécuriser le foncier du complexe et confirmer la topographie, les accès et les réseaux.
- Créer la maîtrise d'ouvrage et installer un conseil scientifique pluraliste.
- Lancer l'étude de marché, le modèle d'exploitation et l'enquête de référence sur l'économie locale.

- Préparer le concours architectural sur la base du plan de masse linéaire et de la morphologie réelle de l'avenue.
- Démarrer l'inventaire des archives, la collecte des témoignages et les partenariats éducatifs.
- Construire le programme de formation des guides, artisans, restaurateurs, techniciens et entreprises locales.
- Arrêter le financement de la première phase avant l'attribution des travaux.

Note méthodologique

Les données financières, de fréquentation, d'emploi et de dépenses présentées dans ce dossier sont des hypothèses de planification destinées à comparer des scénarios. Elles ne constituent ni une prévision garantie ni un devis. Les montants devront être vérifiés par les études techniques, l'étude de marché, le plan d'affaires détaillé et les procédures de passation des marchés. Les sept perspectives architecturales utilisées dans le document expriment une intention de projet et ne remplacent pas les plans d'exécution.
